Harmonogram stavby "Prešov - SOŠ"

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Rok: 2025								
				Mesiac: 8	September				Oktober			
				Týždeň: 35	36	37	38	39	40	41	42	43
CP2025_055	Prešov - SOŠ		0,000									
01	Architektonicko - st...		0,000									
HSV	Práce a dodávky HSV		0,000									
2	Zakladanie		0,000									
216904212.S	Očistenie plôch stlačeným vzduchom L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	76,278									
3	Zvislé a kompletné konštrukcie		0,000									
317161313.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000									
317161321.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm	ks	1,000									
342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	9,230									
342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	53,083									
342948111.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priklincovaním spojky do ložnej škáry počas murovania	m	33,410									
342948115.S	Ukončenie priečok hr. do 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	2,780									
342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	18,340									
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		0,000									
612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	205,396									
612460372.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm	m2	77,614									
612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	205,396									
632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	31,520									
632452644.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	31,520									
642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	6,000									
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		0,000									
941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	35,770									
952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	35,770									
962031138.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených dierovaných, na akúkoľvek maltu alebo penu, hr. od 115 do 200 mm, -0,158 t	m2	93,215									
965043431.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	2,716									
965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	27,160									
965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	27,160									
968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	9,000									
968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	11,820									
968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	12,080									
978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	60,525									
978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	122,704									
979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	35,295									
979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	35,295									
979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	670,605									
979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	35,295									
979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	282,360									
979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	35,295									
99	Presun hmôt HSV		0,000									
999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,176									
PSV	Práce a dodávky PSV		0,000									
711	Izolácie proti vode a vlhkosti		0,000									
711111010.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej vode do 1,5bar jednozložkovým HI tmelom na báze cementu vodorovná	m2	28,520									
711111015.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej vode do 1,5bar jednozložkovým HI tmelom na báze cementu zvisla	m2	15,723									
998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	100,000									
725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety		0,000									
725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	5,000									

725122813.S	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	4,000
725190151.S	Montáž sanitárnej priečky z drevotrieskových DTDL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre suché priestory s nerezovým kovaním	m2	22,329
725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	5,000
725291113.S	Montaž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na uterák, mydelnička, kôš)	ks	1,000
725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	3,000
725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	5,000
725901000	Demontáž potrubí vody a kanalizácie	súbor	1,000
998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	100,000
735	**Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá**		**0,000**
7351000	Úprava rozvodov vykurovania a doplnenie radiátorov	ks	4,000
763	**Konštrukcie - drevostavby**		**0,000**
763120011.S	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	21,294
763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	28,520
998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	100,000
766	**Konštrukcie stolárske**		**0,000**
766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	5,000
766689010	D2 - Montáž a dodávka interiérové automaticky otočné dvere, hliníkové , 800x1970 mm, bezprahová úprava, biele	ks	1,000
998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	100,000
769	**Montáže vzduchotechnických zariadení**		**0,000**
769011100.S	Montáž ventilátora malého axiálneho vsuvného do potrubia veľkosť: 200	ks	4,000
769100	Nútené vetranie WC - rozvody potrubia	súbor	1,000
998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	100,000
771	**Podlahy z dlaždíc**		**0,000**
771576304.S1	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného	m2	31,520
771591224.S	Montáž kovových profilov pre dlažbu do tmelu flexibilného - prechodový	m	2,800
771991101.S	Zametanie podkladu pred kladením dlažby	m2	31,520
771991102.S	Vysávanie podkladu pred kladením dlažby	m2	31,520
771991111.S	Penetrovanie podkladu pred kladením dlažby	m2	31,520
998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	100,000
781	**Obklady**		**0,000**
781445210.S1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	127,782
781451000	Montáž a dodávka zrkadla 500x1000 mm- ozn. P4	ks	1,000
781991121.S	Penetrovanie podkladu pred kladením obkladu	m2	127,782
998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	100,000
784	**Maľby**		**0,000**
784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	106,134
784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	16,208
784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	31,520
784441110.S	Maľby latexové tónované dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	16,208
784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	106,134
02	**Elektroinštalácia**		**0,000**
HSV	**Práce a dodávky HSV**		**0,000**
6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**		**0,000**
612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	3,000
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**		**0,000**
971038141.S	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	20,000
971038441.S	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,08600t	ks	1,000
974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	30,000
974049121.S	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	20,000
974049341.S	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii hĺbky 25 mm, š. 40 mm -0,00220t	m	10,000
M	**Práce a dodávky M**		**0,000**
21-M	**Elektromontáže**		**0,000**
210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	40,000
210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	20,000

210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	1,000	
210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	2,000	
210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	5,000	
210111611.S	Signálka LED chodbová červená / biela	ks	1,000	
210193073.S	Domova rozvodnica do 56 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	2,000	
R	Úprava v Rozvádzači R1, vr. materiálu	ks	1,000	
210290751.S	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	ks	4,000	
210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	150,000	
210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	100,000	
210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	20,000	
220260022.S	Krabica KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	8,000	
220300921.S	Svorkovnice do krabíc, montáž svorkovnice,zapojenie vodičov na svorky, svorka 1 pólová	ks	50,000	
MD	Mimostavenisková doprava	%	2,500	
MV	Murárske výpomoci	%	5,000	
OS	Osvetľovacia sústava - zoznam viď samostatná príloha	ks	1,000	
PD	Presun dodávok	%	1,500	
PM	Podružný materiál	%	1,000	
PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,500	
22-M	**Montáže oznam. a zabezp. zariadení**		**0,000**	
220261632.S	Osadenie príchytky, vyvŕt.diery,zatlač.príchytky,v tvrdo pál.tehle alebo stred.tvrdom kameni D 8 mm	ks	120,000	
OST	**Ostatné**		**0,000**	
HZS001111	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	hod	5,000	
HZS001112	Asistencia ostatným profesiam	hod	5,000	
HZS001113	Príprava a odborné preskúšanie	hod	5,000	
HZS001114	Ostatné elektroinštalačné práce	hod	40,000	
HZS001115	OPaOS VTZ E (revízia) a vypracovanie správy	kpl.	1,000	
VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**		**0,000**	
001100001.S	Meranie - bez rozlíšenia	eur	1,000	
001300021.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - kompletačná činnosť bez rozlíšenia	eur	1,000	
001400055.S	Vyznačenie káblovej trasy a rozmeriavanie prístrojov	eur	1,000	
001400056.S	Foto - videodokumentácia elektroinštalačných rozvodov pred omietaním a zásypom	eur	1,000	
04	**Zdravotechnika**		**0,000**	
HSV	**Práce a dodávky HSV**		**0,000**	
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**		**0,000**	
965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,720	
974031143.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	7,000	
979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,675	
979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,675	
979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	1,675	
PSV	**Práce a dodávky PSV**		**0,000**	
713	**Izolácie tepelné**		**0,000**	
713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	52,000	
713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	10,000	
713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	33,000	
998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	
721	**Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia**		**0,000**	
721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	8,000	
721172022.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 75	m	4,000	
721172023.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 110	m	13,000	
721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	12,000	
721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	6,000	
721172354.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	2,000	
721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	2,000	
721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	4,000	
721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	2,000	
721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	6,000	
721290009.S	Montáž prívzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	2,000	

721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	36,000	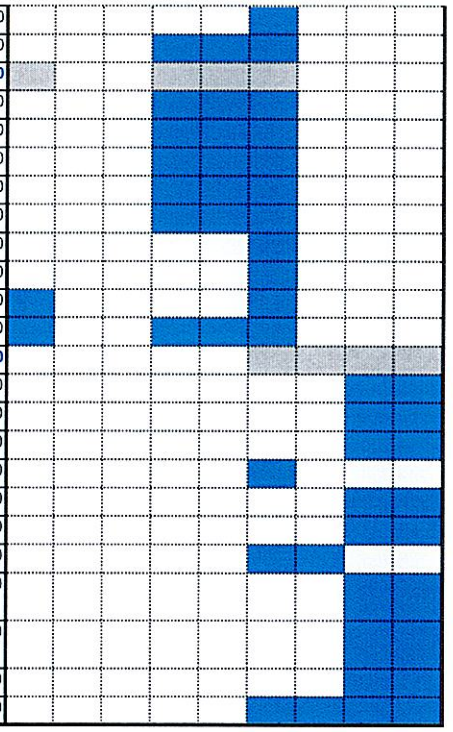
998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	
722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**		**0,000**	
722171152.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	62,000	
722171153.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm	m	11,000	
722171154.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 32 mm	m	12,000	
722173163.S	Montáž plasthliníkového prechodu pre vodu lisovaním D 32 mm	ks	2,000	
722173181.S	Montáž plasthliníkovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	16,000	
722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	51,000	
722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	51,000	
722301000	Preložka hydrantu	súbor	1,000	
998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	
725	**Zdravotechnika - zariaďovacie predmety**		**0,000**	
725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	5,000	
725119415.S	Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej	ks	1,000	
725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	6,000	
725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	6,000	
725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	2,000	
725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	4,000	
725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	8,000	
725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	
725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	4,000	
725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pisoárovej do D 50 mm	ks	2,000	
998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	
